

屯門南延綫項目

屯門區議會交通運輸委員會

2026年8月26日

項目建造工程進展

鐵路高架橋

- 正進行屯馬綫屯門站的越位軌道設施改建工程，以接駁高架橋延伸段
- 正全力建造高架橋地基、橋墩及橋身結構



註：車站名稱僅為工作名稱

組裝橋身結構

➤ 鐵路高架橋主要以**大型架橋機**及**平衡懸臂架設法**吊裝預製組件的形式建造



以架橋機吊裝預製組件 (模擬圖)

利用大型架橋機逐一吊起預製件，安裝於橋墩之間。架橋機會移動至下一個施工位置，繼續在空中建造高架橋

平衡懸臂架設法

以起重機從橋墩兩側對稱向外吊裝預製件，減少地面施工空間需求

註：圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化

第16區站

屯門河（東岸）工地
（原有屯門游泳池及附近）

- 正進行車站地基及結構工程
- 原有屯門游泳池正進行拆卸



屯門南站



湖景路工地

- 車站工地範圍已成型，地基工程大致完成
- 開始建造車站結構

屯門海濱花園工地

- 正進行車站出入口及連接橋地基工程

註：車站名稱僅為工作名稱

重置社區設施

屯門游泳池



已完成升級重置並於2026年2月開放



屯門康樂體育中心練習草坪

- 於前歷奇公園用地大致完成重置，正進行驗收工作

兆禧橋



完成重置並於2026年6月開放

屯門碼頭臨時公廁



- 臨時公廁大致完成，正進行驗收工作
- 原有屯門碼頭公廁將關閉並拆卸
- 相關鐵路工程完成後於原址重置

良好工地管理 – 防風防水浸措施

- 在惡劣天氣前，工地會作出相應部署及準備工作



移除/降下水馬上的擋板或綠網




繫穩工地物料



清理渠道及出水口，保持暢通




降下流動式起重機吊臂及設於安全狀態

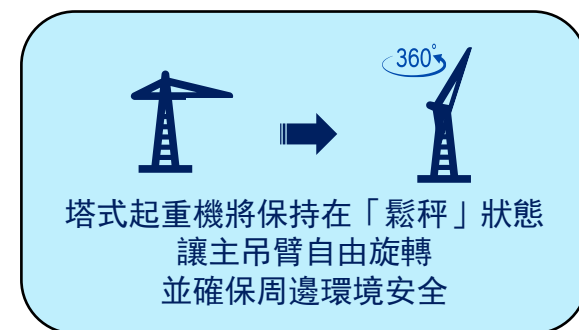


臨時交通管理措施

臨時交通管理措施


- 將按工程需要繼續分階段臨時改道或封閉，以實施相關臨時交通管理措施，區內一些政府用地會繼續用作工地，直至工程完成
- 港鐵公司會與相關政府部門就各項安排持續進行洽商，並會與鄰近持份者保持溝通，相關措施會在獲得政府審批後實施，以確保符合安全及設計標準

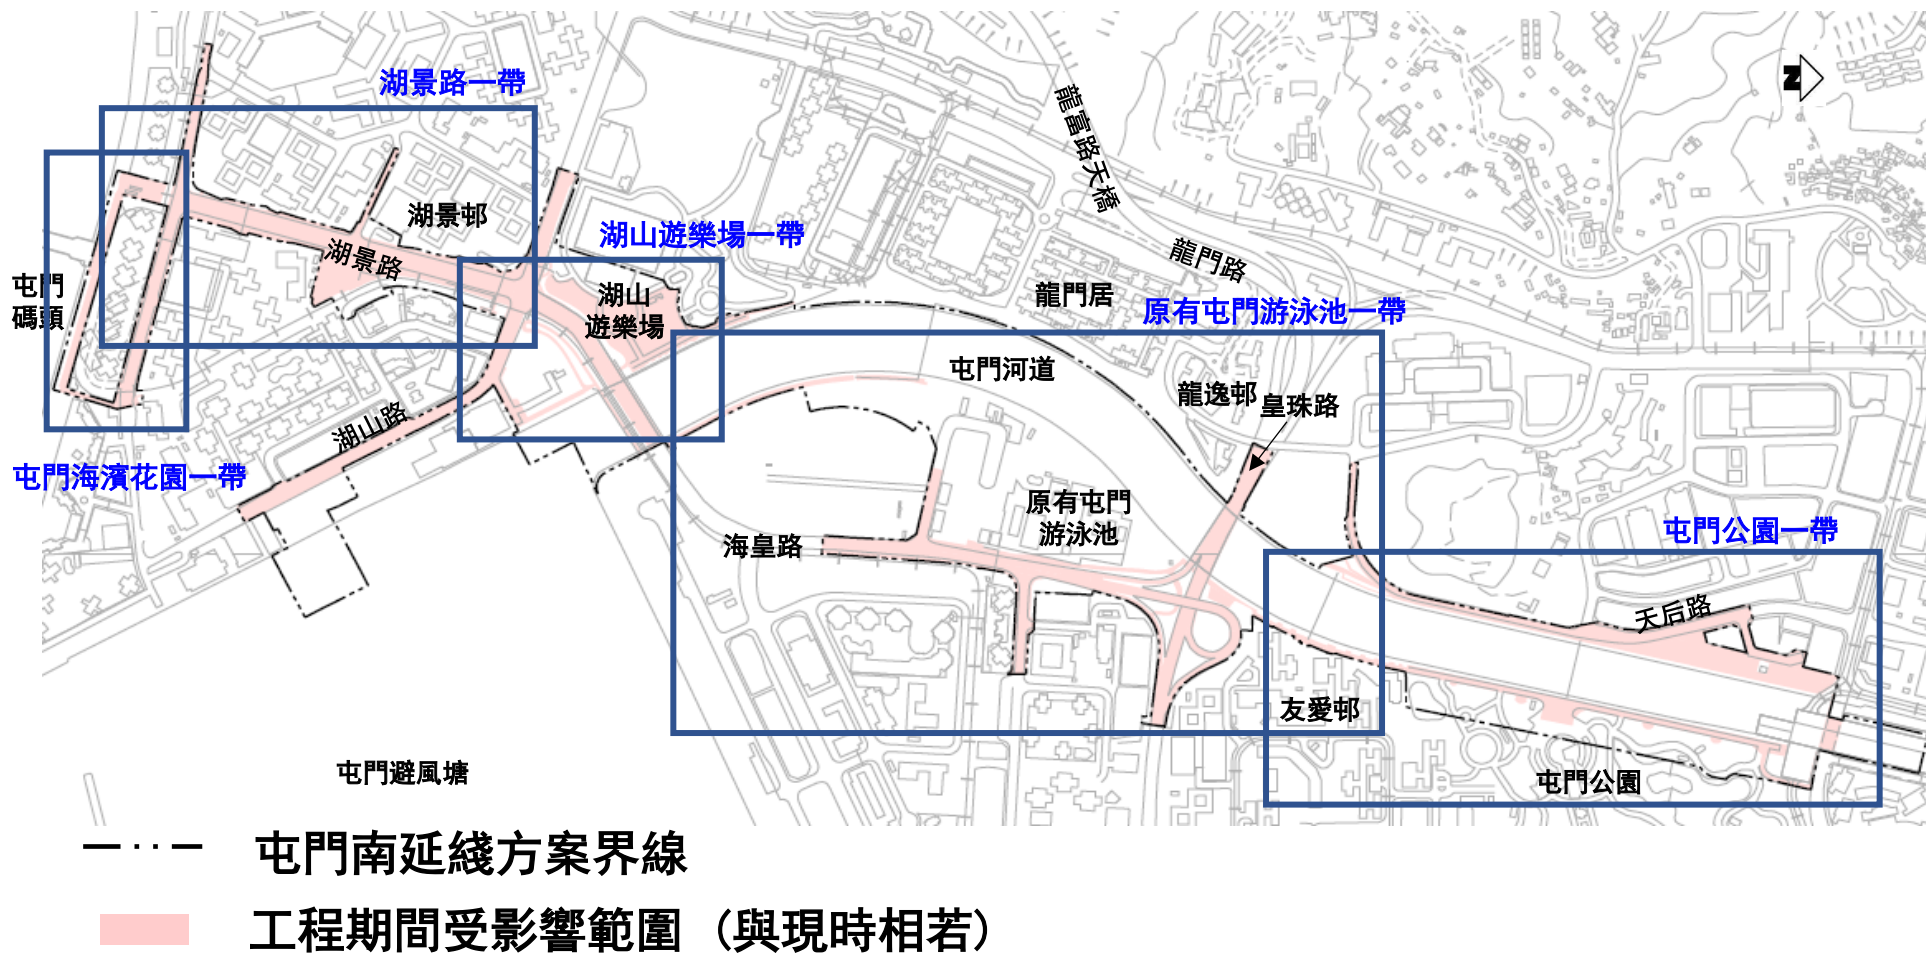

屯門公園一帶 現時至2027年的臨時交通管理措施

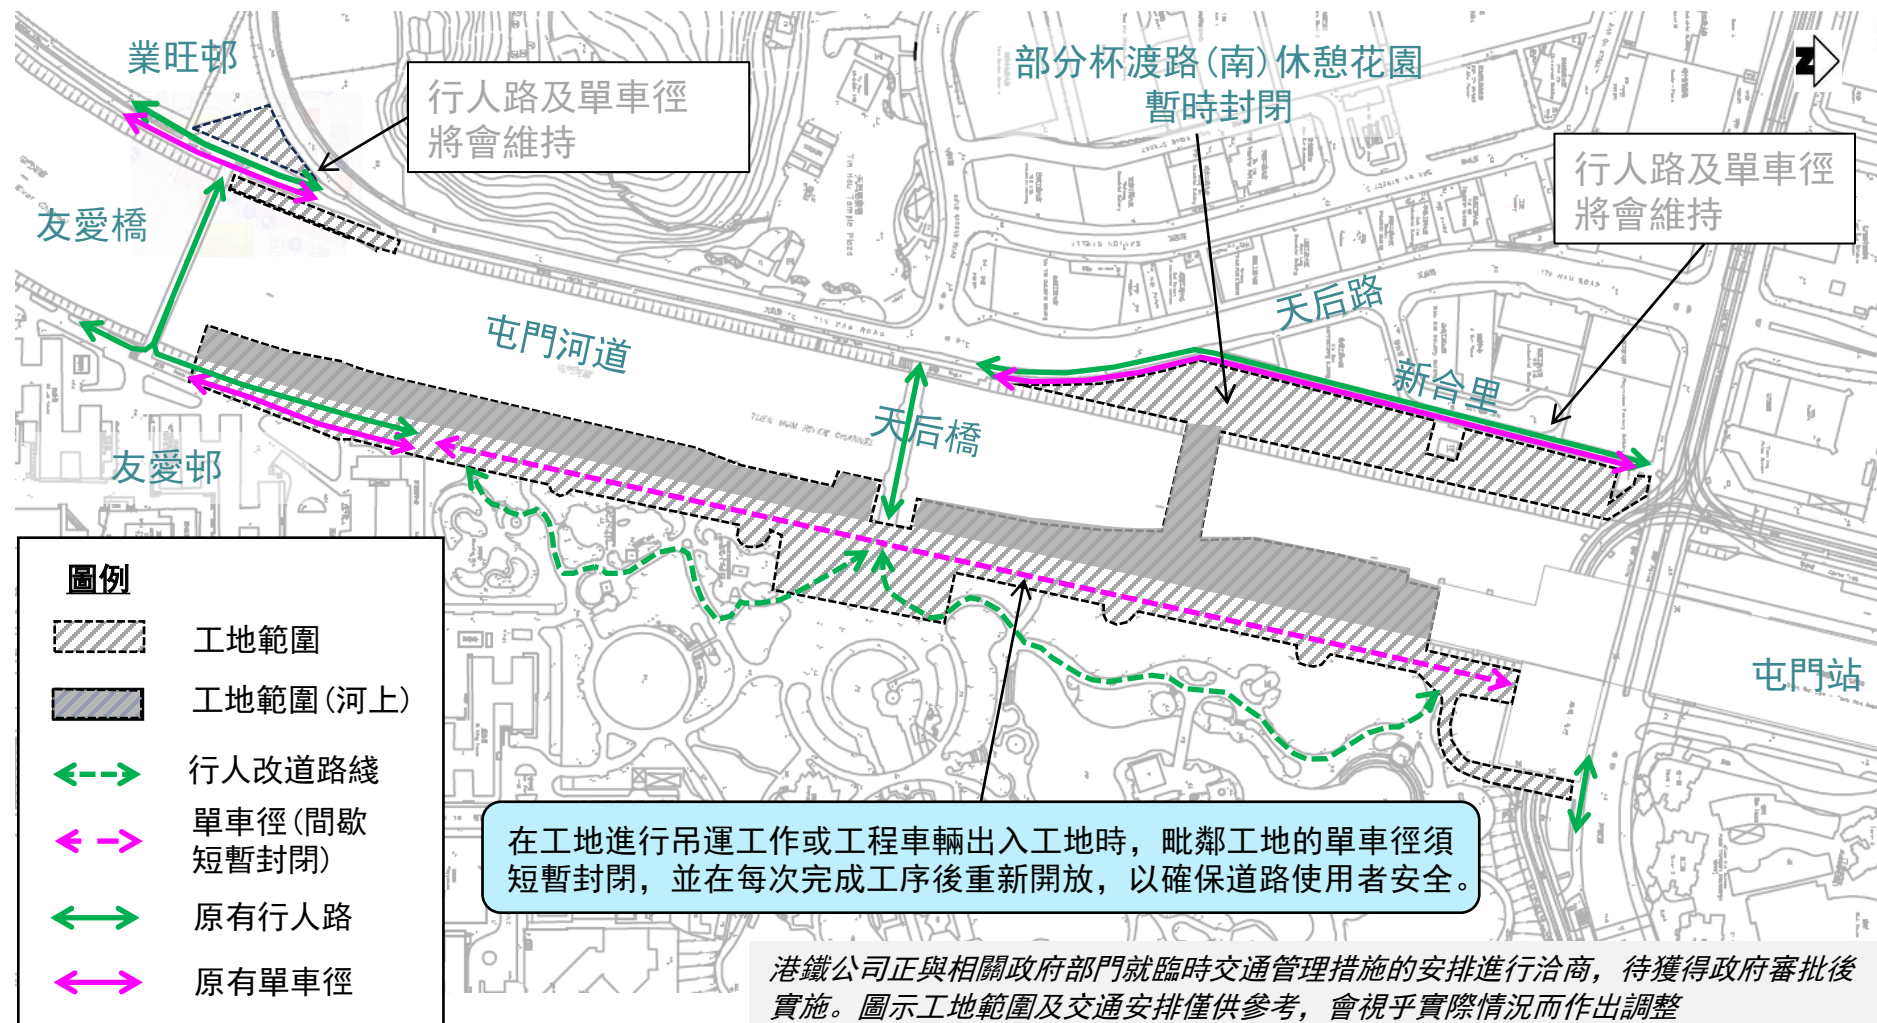

原有屯門游泳池一帶 現時至2027年的臨時交通管理措施

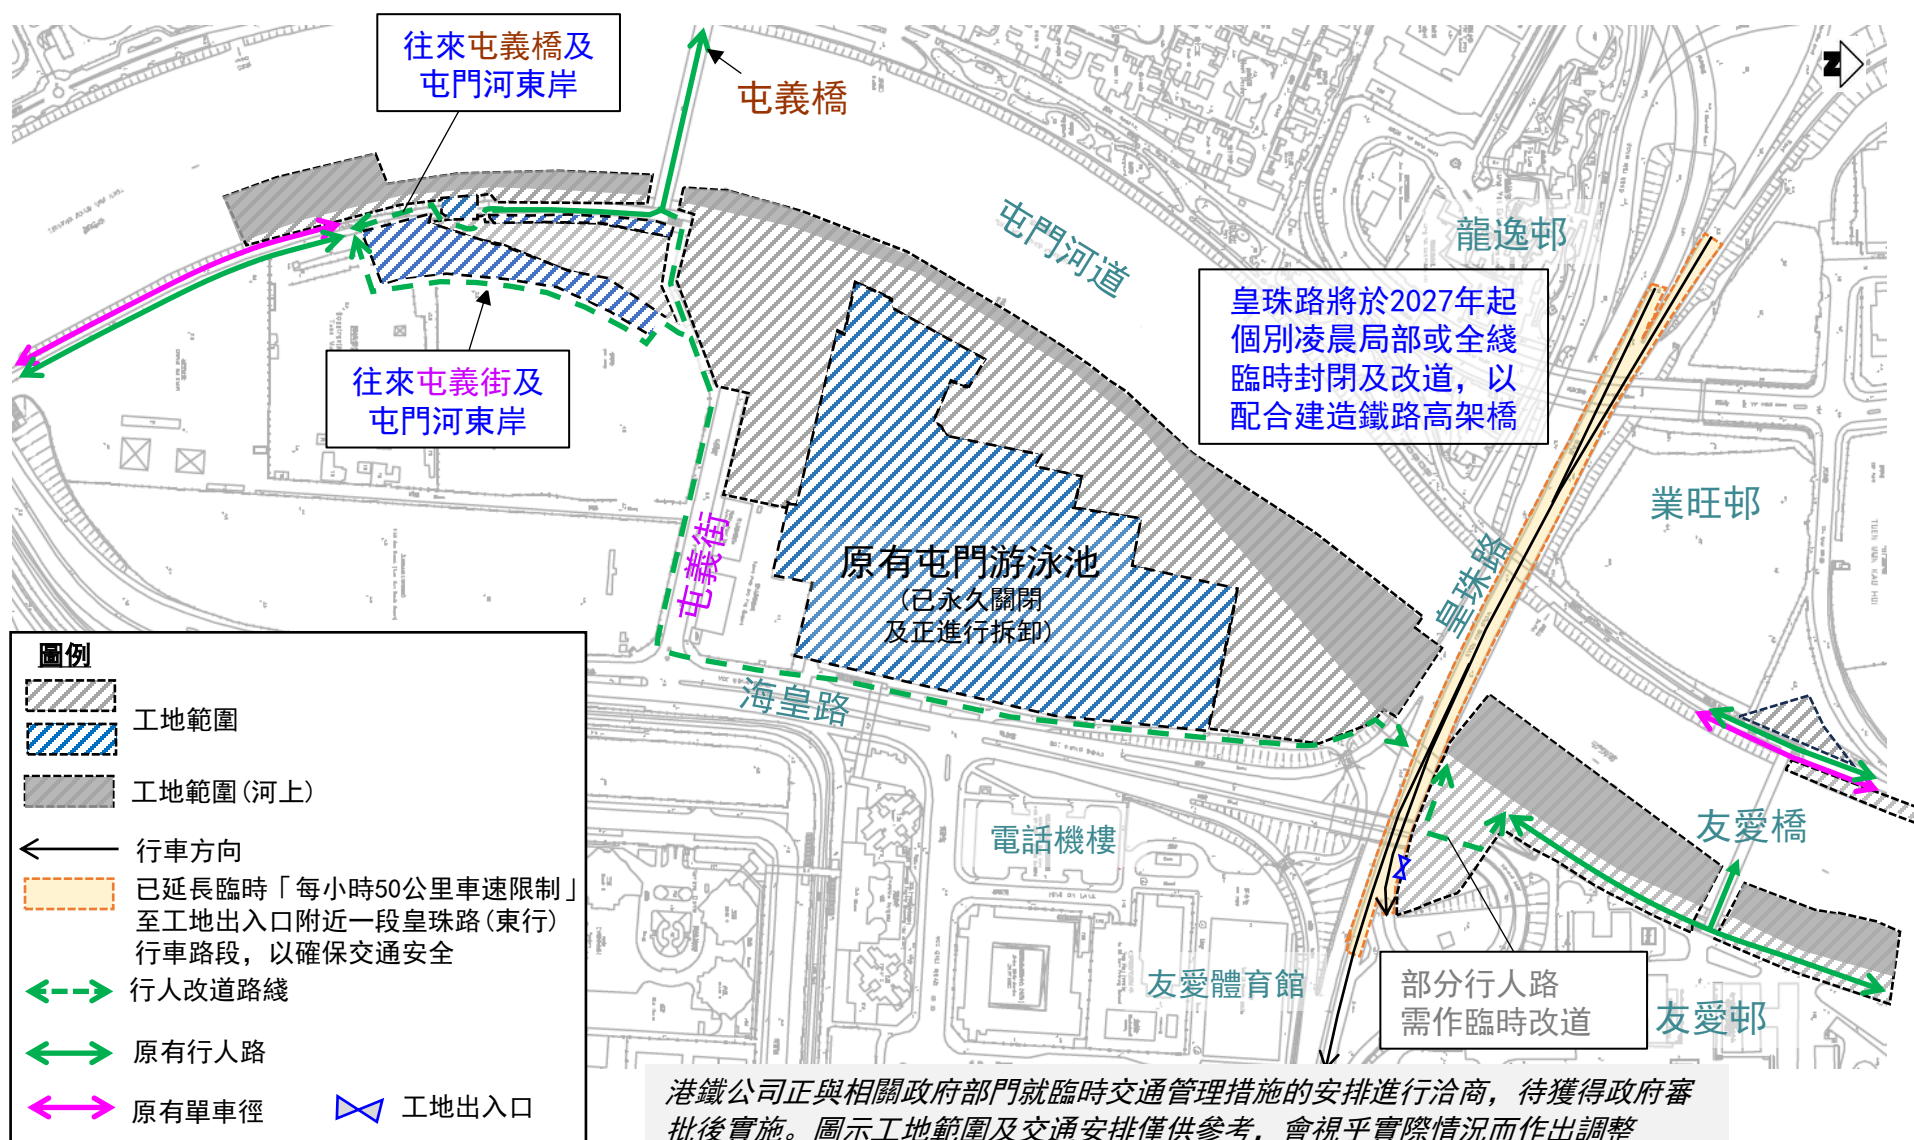

皇珠路凌晨臨時交通改道

- 鐵路高架橋將橫跨皇珠路，當中涉及在行車路上進行的吊運及安裝預製組件工序、以及移動架橋機等，會安排於凌晨封路進行，以減少對日間路面交通的影響


鐵路高架橋模擬圖



註：圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化

皇珠路凌晨臨時交通改道

➤ 進行鐵路高架橋的大型預製組件吊運及安裝

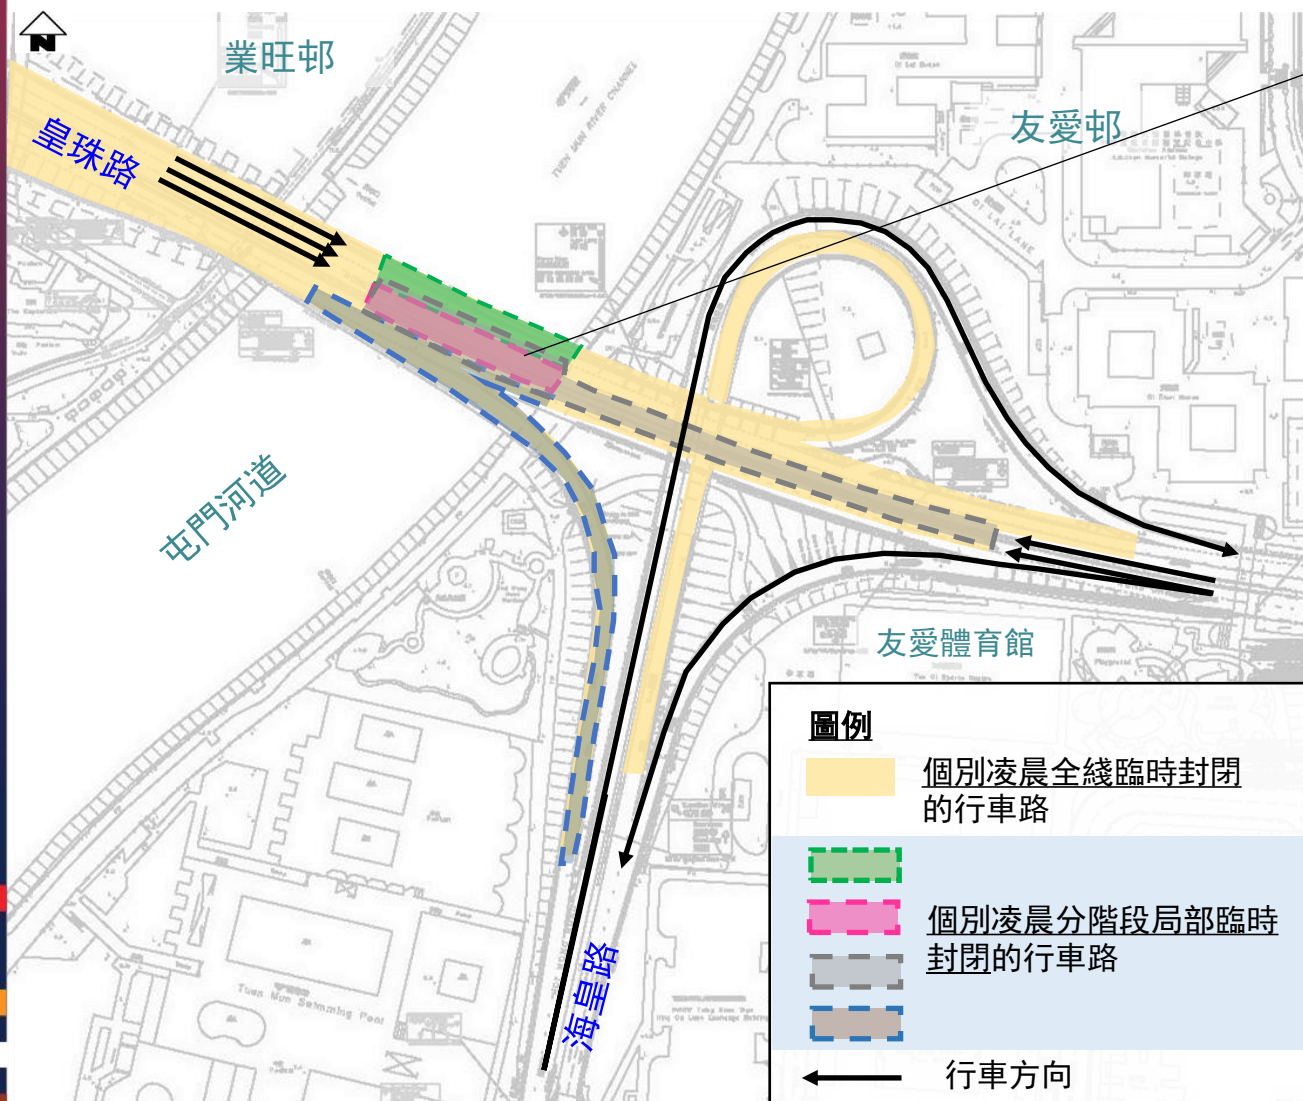

2027年起個別凌晨：


- 架橋機於皇珠路上空移動期間，皇珠路全綫臨時封閉及改道
- 皇珠路分階段局部臨時封閉，期間會維持適當行车綫，以吊運及安裝高架橋預製組件
- 協助居民及道路使用者適應改道安排：
 - ✓ 預先向社區發放資訊
 - ✓ 設立適當指示牌

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。
圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整



- 港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整


湖山遊樂場一帶 現時至2027年的臨時交通管理措施

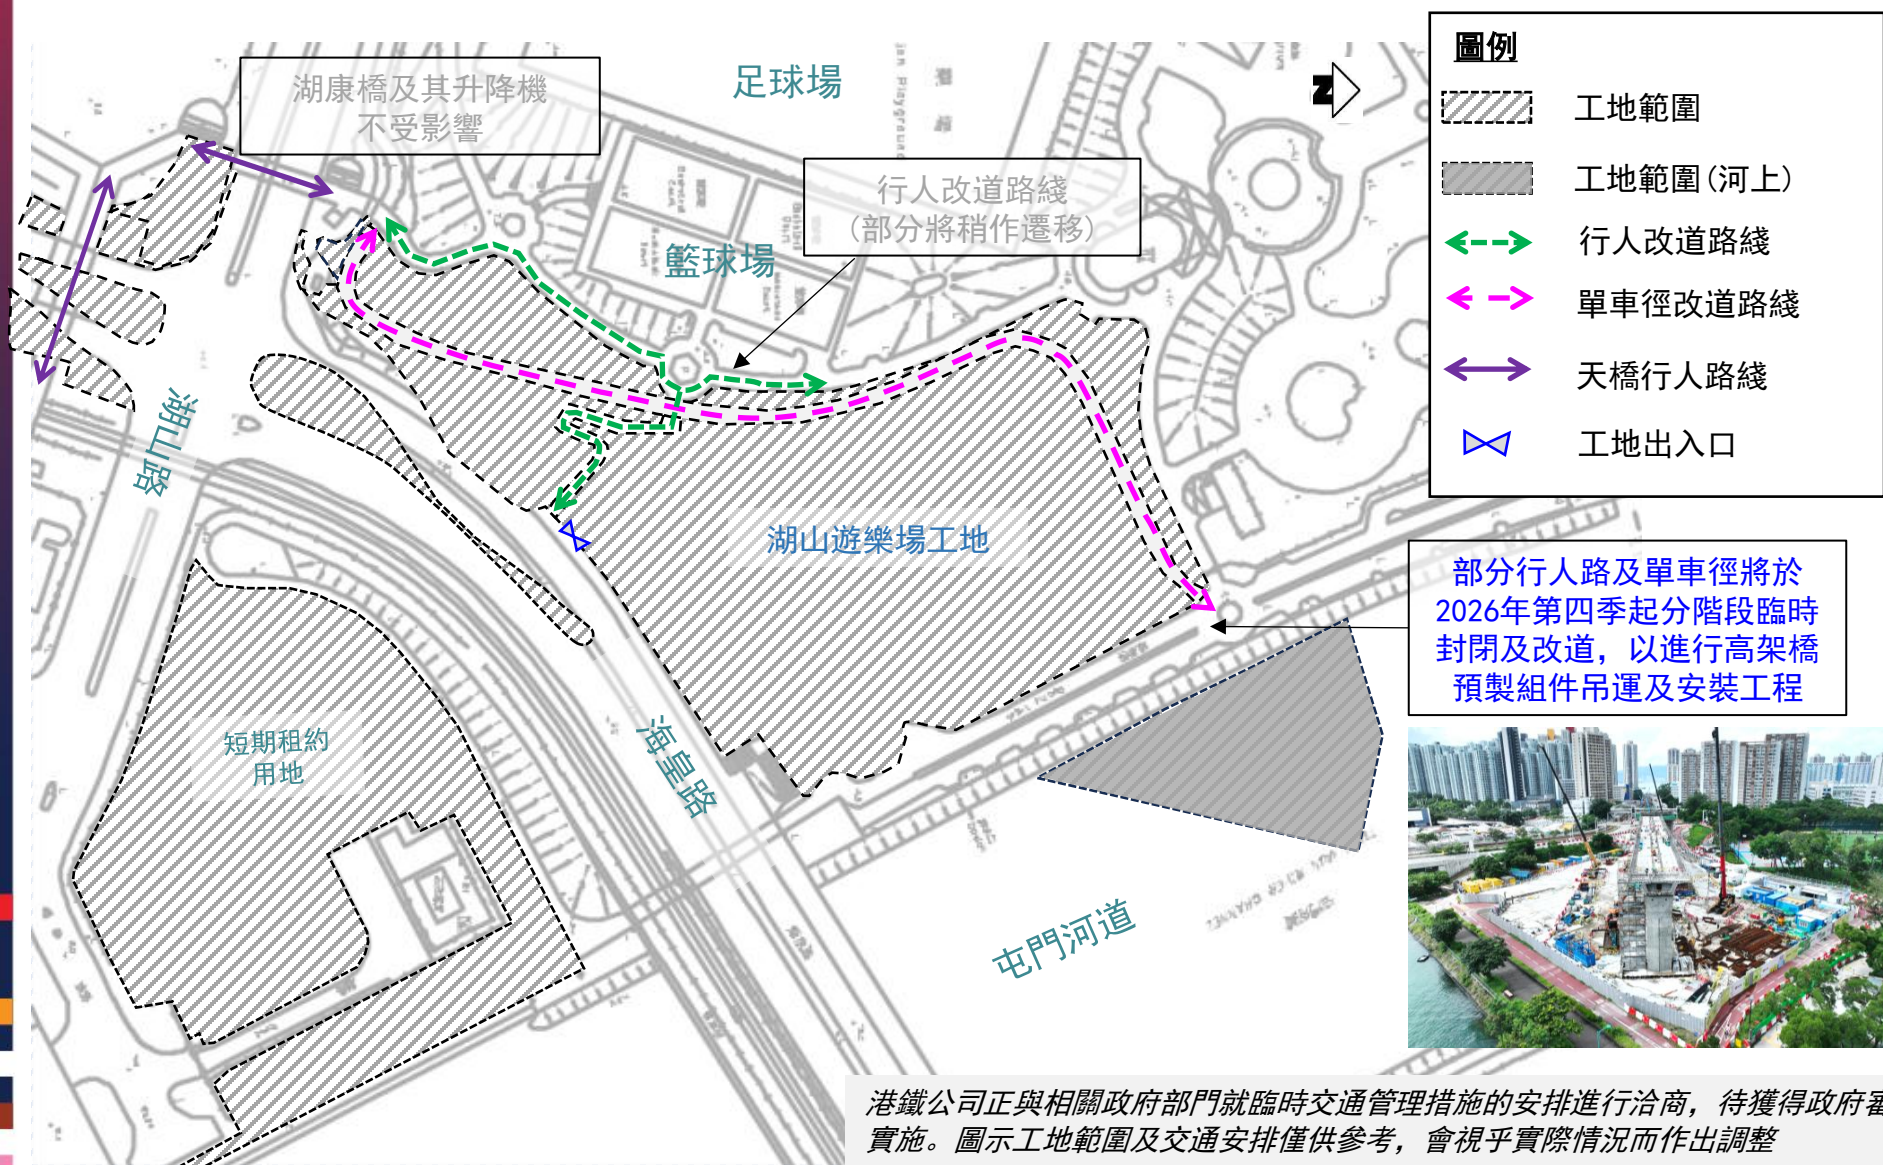

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

湖景路、湖山路及海皇路凌晨臨時交通改道 現時至2027年的臨時交通管理措施

➤ 進行鐵路高架橋及屯門南站的大型預製組件吊運及安裝

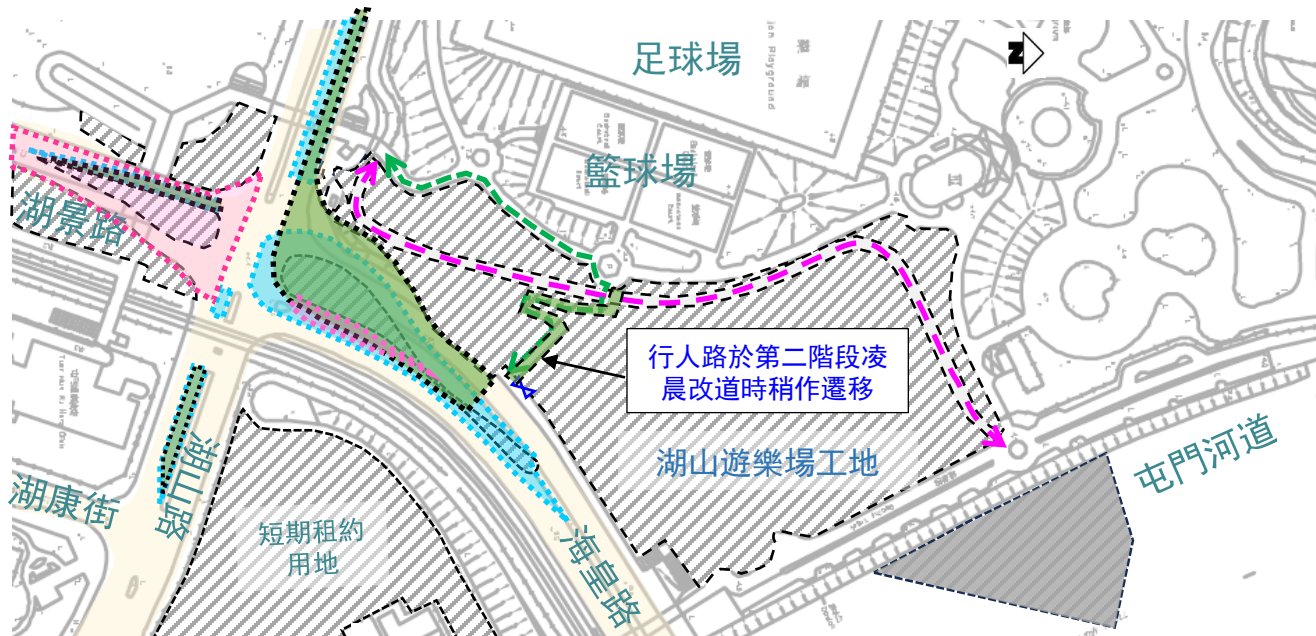

圖例

- 原有工地範圍
- 現有單車徑改道路線
- 行人改道路線
- 工地出入口
- 凌晨工地範圍（主要階段）**
 - 第一階段
 - 第二階段
 - 第三階段

	第一階段	第二階段	第三階段
海皇路	南行 - 只准左轉 北行 - 不受影響	南行 - 不受影響 北行 - 全線封閉	南行 - 只准左轉 北行 - 不受影響
湖山路	東行及西行 - 部份行車線封閉	不能轉入海皇路北行	不能轉入湖景路
湖景路	不受影響	不能轉入海皇路北行	全線封閉 (包括湖月街)


協助居民適應改道安排：

- ✓ 預先向社區發放資訊
- ✓ 工作人員在場協助
- ✓ 設立適當指示牌

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

湖景路一帶 現時至2027年的臨時交通管理措施


- 湖景路及湖月街將於個別凌晨臨時封閉，以進行鐵路高架橋及屯門南站的大型預製組件吊運及安裝
- 湖景路及部分湖翠路於2027年個別凌晨臨時封閉，以吊運及安裝屯門南站出入口連接橋預製組件
- 緊急車輛通道將會維持

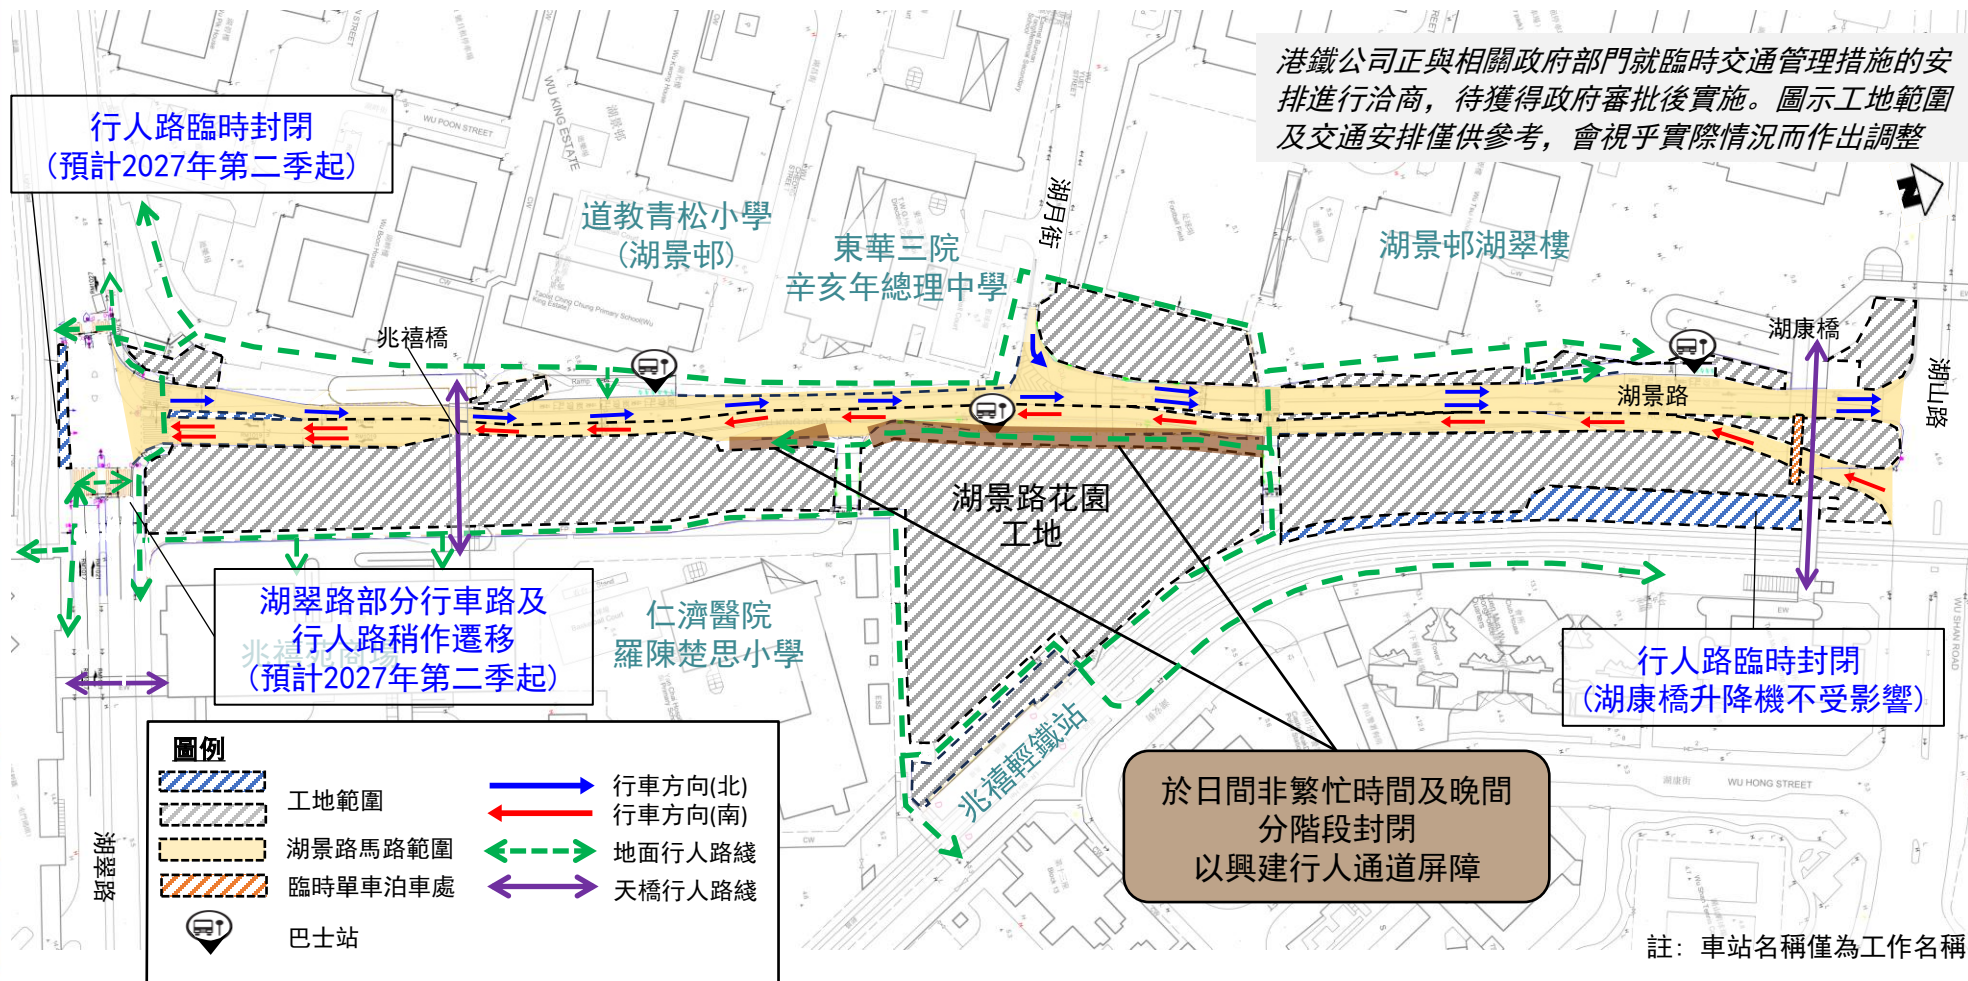

湖景路及湖翠路凌晨臨時交通改道



湖景路緊急車輛通道將會維持

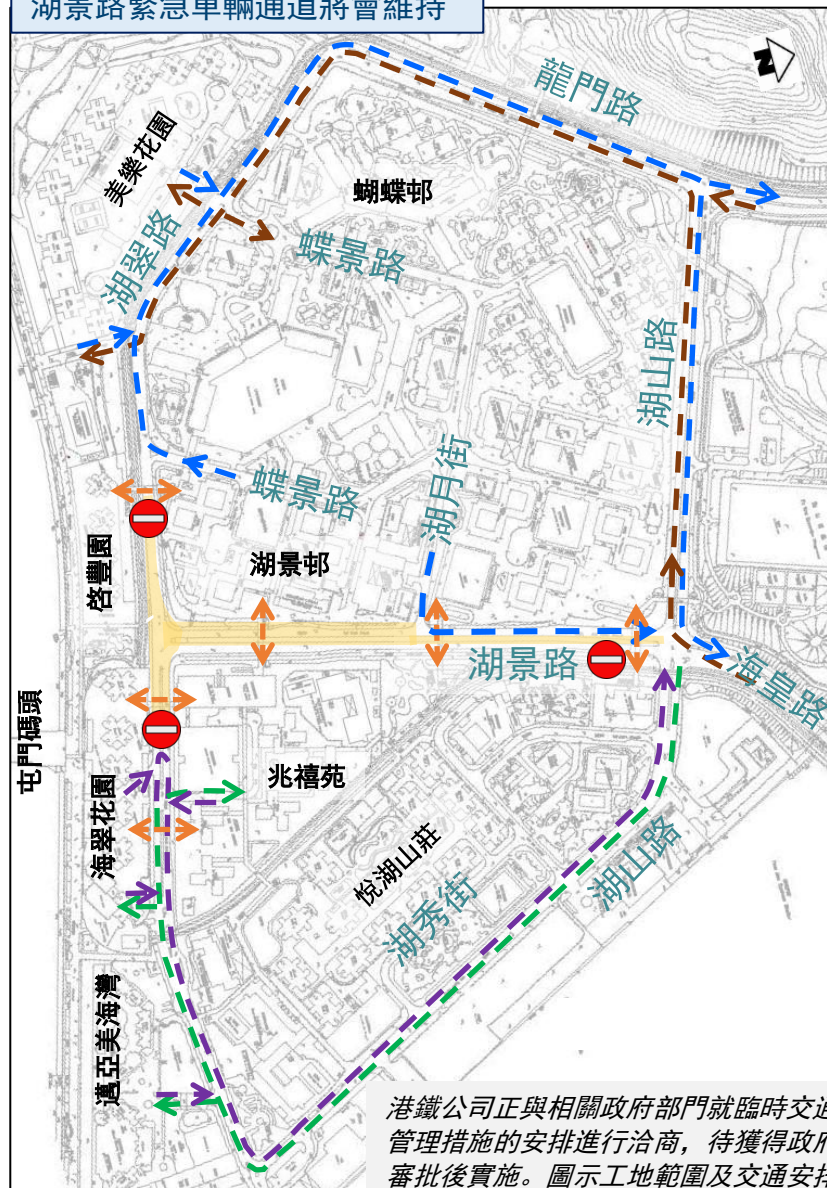

港鐵公司正與相關政府部門就臨時交通管理措施的安排進行洽商，待獲得政府審批後實施。圖示工地範圍及交通安排僅供參考，會視乎實際情況而作出調整

- 湖景路及部分湖翠路將於2027年個別凌晨臨時封閉，以吊運及安裝屯門南站出入口連接橋預製組件
- 臨時交通改道期間：
 - 往來蝴蝶邨/美樂花園/啟豐園一帶的車輛可改行龍門路前往湖翠路/海皇路
 - 往來海翠花園/兆禧苑/邁亞美海灣一帶的車輛可改行湖山路前往湖翠路/海皇路

圖例


- 臨時封閉的行車路段
- 往來蝴蝶邨/美樂花園/啟豐園的行車路線
- 往來海翠花園/兆禧苑/邁亞美海灣的行車路線
- 現有行人天橋/地面行人過路處



註：車站名稱僅為工作名稱。圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考，可能會有所變化

屯門海濱花園一帶 現時至2027年的臨時交通管理措施

➤ 進行屯門南站出入口地基及結構工程

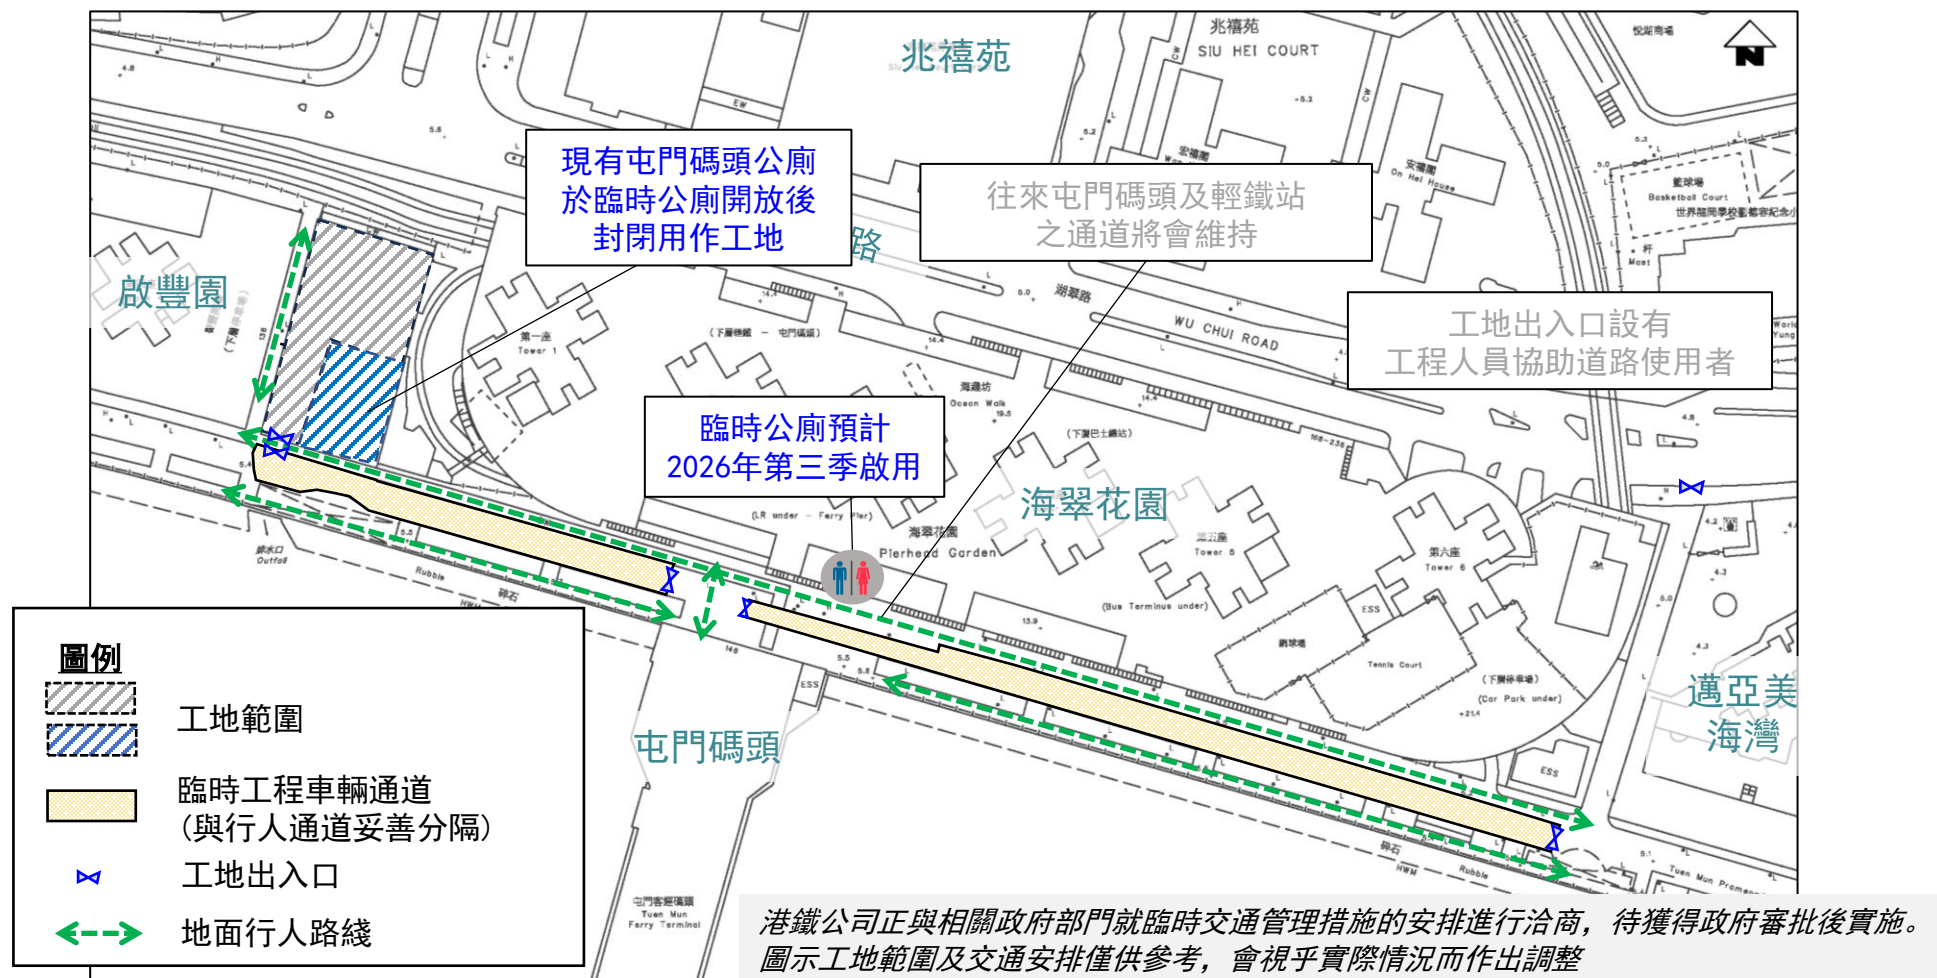

註：車站名稱僅為工作名稱

社區聯絡



積極連繫屯門 共建更好鐵路社區



>140

視察/會議



>300

地區團體/學校



>120

講座/工作坊/
地區活動



>87,200

持份者

工程資訊及溝通渠道



工地海報

社區及學校聯絡小組

社交平台貼文

工程快訊 (3. 2026)



項目網站及刊物

<https://mtrtuenmunsouth.hk>



工程通告/單張

屯門南延綫項目主體工程



承建商24小時熱綫: 5186 6082

港鐵工程熱綫: 2993 3333



電郵:

newprojects@mtr.com.hk



網上意見表

(項目網站內的「聯絡我們」版面)

謝謝

